Tidsplan 2017 - pilotprojekt afdeling B

Sekoia infoskærme

Aktiviteter	Reference	Beskrivelse	Ansvarlig	Milepæle	Leverance(-r)	afhængighed	Status
Teknisk implementering	**1.0**						
Opsætning af trådløst netværk på Enggården, etape 1	1.1	Der opsættes radioporte mv. i afdeling B således, at der er trådløs dækning i boliger og på fællesarealerne i afdelingen.	IT/Jan Jansen	01-aug			Forventes afsluttet ultimo juni
Indkøb og opsætning af switche, Enggården	1.1.1	Der opsættes switche til afdeling B således, at der er trådløs dækning i boliger og på fællesarealerne i afdelingen.	IT/Jan Jansen	11-sep			påbegyndes medio august
Konfigurering af netværk - åbning af porte mv.	1.2		IT/Jan Jansen	11-sep			
Fremsendelse af tegning med radioporte samt placering af skærme		Fremsendelse af tegning med radioporte samt placering af skærme	IT/Jan Jansen	uge 38		2.5	
Afprøvning af skærme	1.3	De to egnede skærme, der pt. er tilgængelige hos kendte leverandører, afprøves	IT/Jan Jansen/Rune TK			Sekoia tilbagemelding	Afventer tilbagemelding fra Sekoia om hvorvidt TDC kan levere skærme
Beslutning om køb el. leasing af skærme	1.3.1	Der skal træffes en beslutning om hvilken skærmleverandør der vælges samt om finansiering/køb el. leasing	IT/Jan Jansen/Rune TK	01-sep	Valg af skærm og finansierings-form	1.3	
Møde med Sekoia vedr. teknisk afklaring	1.4	Møde hvor der samles op på netværk, skærme og øvrige tekniske spørgsmål samt drøftelse af implementeringsplanens tekniske aktiviteter	Rune TK			1.2 og 1.3.1	
Opsætning af beslag til skærme		Der opsættes beslag til skærmene på den valgte placering i boliger og fællesarealer	?				
Test af internet		Sekoia tester deres løsning på netværket på Enggården	Sekoia/It			1.2	
Organisatorisk implementering og kommunikation	**2.0**						
Kontraktindgåelse	2.1	Indgåelse af aftale med Sekoia om opsætning og implementering samt uddannelse	Rune TK/Thyra				
Organisering og planlægning af implementeringsaktiviteter	2.2		Rune TK	18-aug			
Afholdelse af 1. styrgruppemøde	2.2.1	Møde med deltagelse af JJ, Ole, Thyra og Rune, hvor projektplan færdiggøres og godkendes.	Rune TK/Styregruppe	uge 33			
Implementeringsopstartsmøde med Sekoia	2.3	Drøftelse af placering af skærme, ibrugtagning af app's mv. Deltagelse af Skeoia, RTK, IT/JJ, Thyra, Ole, Trine og Cathja hvis muligt	Rune TK	uge 34			
Ledelsesmøde med Sekoia	2.4	Sekoia, Ole, Thyra, RTK og alle relevante ledere fra Enggården samt it deltager og gennemgår implementeringsplan og aktiviteter samt hvem der er ansvarlige for hvad i processen. Beslutninger vedr. placering, anvendelse af app's, regler osv. gennemgås.	Rune TK	29-aug			
Beslutning om placering af skærme i boliger og fællesområder	2.5		Rune TK/Ole A.		Beslutning om placering af skærme i boliger og fællesområder		
Beboermøde/orientering om skærme	2.6						
Udarbejdte info-pjece, der kan /uddelessendes til beboere og pårørende	2.7		Rune TK/Ole A.			2.5	
Infomateriale til beboere og pårørende	2.7.1		Rune TK/Ole A.			2.5	
Medarbejdertræning/uddannelse			Sekoia				
Skærme og andet udstyr opsættes			Sekoia/It				
Skærme og andet udstyr testes			Sekoia/It				
Introduktion til dag, aften og nattevagt			Sekoia				
Go-live - systemet tages i brug			Alle				
Opfølgnings- og evalueringsmøde med Sekoia			Sekoia				
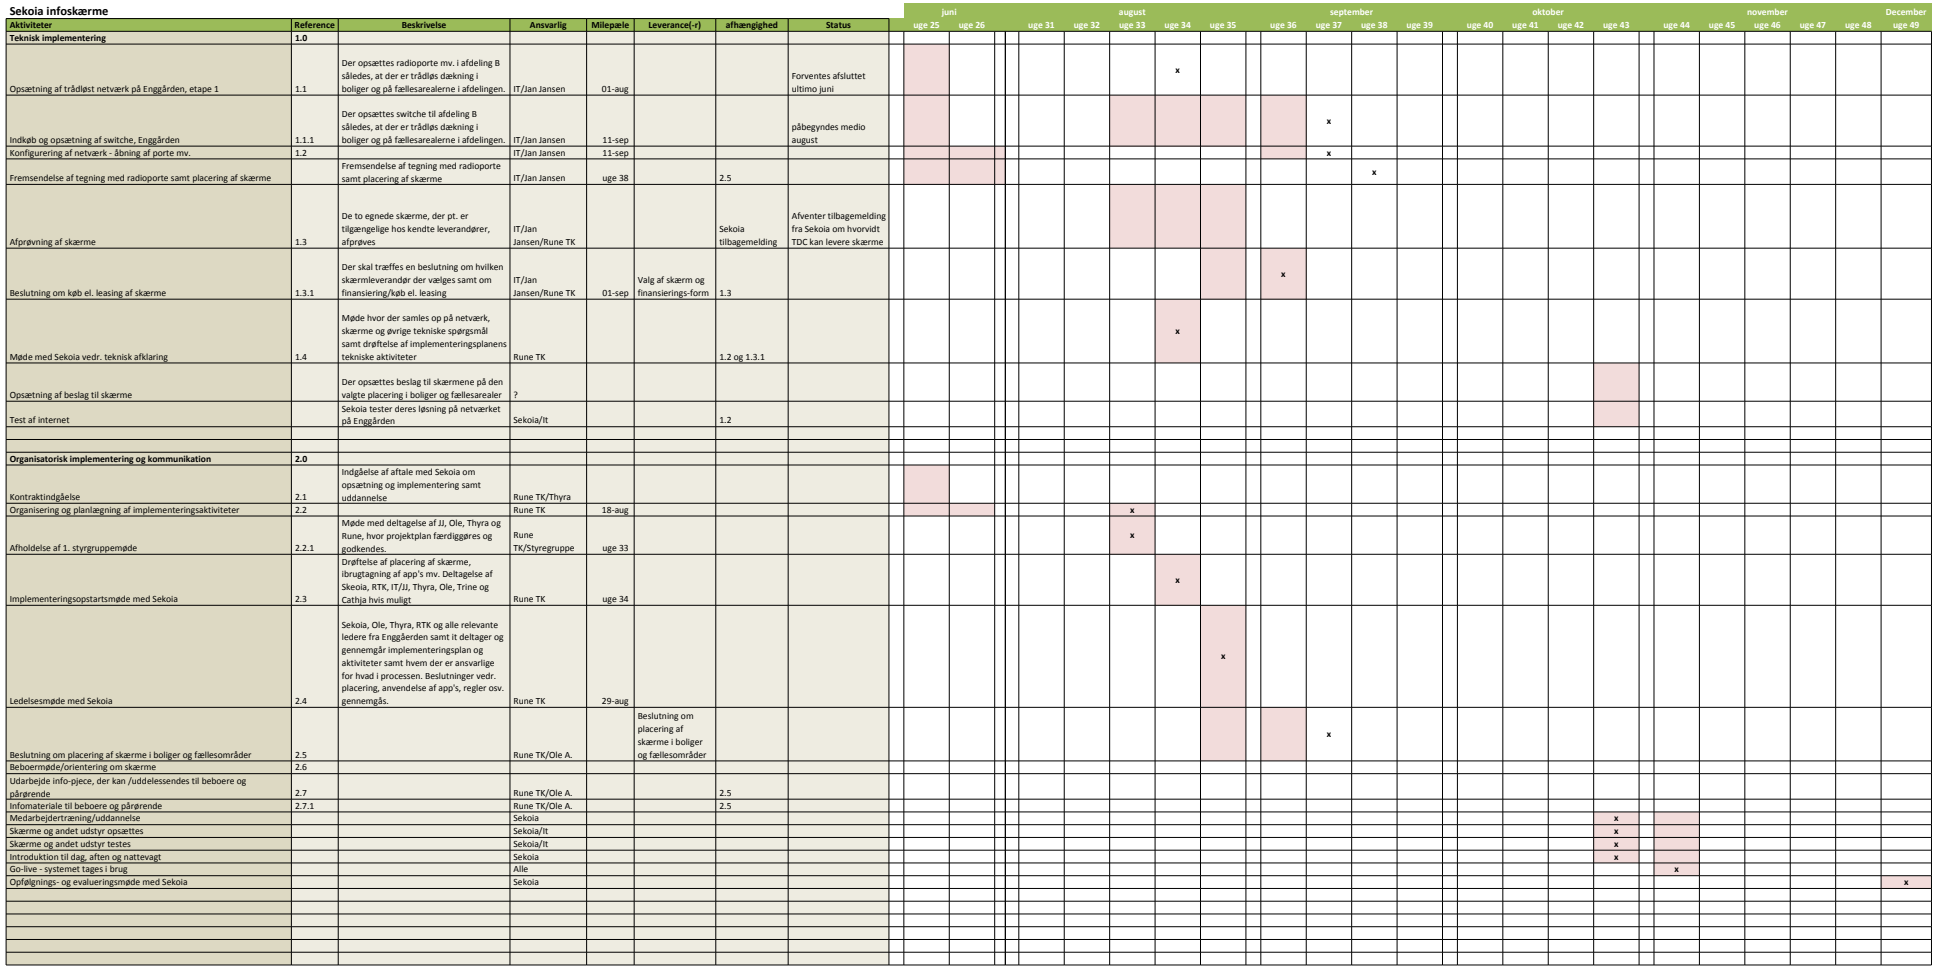
juni			august					september				oktober				november					December
uge 25	uge 26	uge 31	uge 32	uge 33	uge 34	uge 35	uge 36	uge 37	uge 38	uge 39	uge 40	uge 41	uge 42	uge 43	uge 44	uge 45	uge 46	uge 47	uge 48	uge 49
					x															
								x												
								x												
									x											
							x													
					x															
														x						
				x																
				x																
					x															
						x														
								x												
														x						
														x						
														x						
															x					x
